
Teslimat 1 - Yük 1 / 6 - 40 ft konteyner 12.03 m

4 palet: 4 / 4 ana pozisyon | 316 kalıp | en yüksek kolon 2372 mm / 2393 mm iç yükseklik | iç 12032 U x 2352 G x 2393 Y mm

Palet tabanı 2400 x 2340 (2.400 taban kasaya göre kesilir; katlı düz kalıplar boyuna 2591, enine 2286'ya taşar). Arka bölme: köşe kalıbı paleti 1200 derinlik enine döndürülmüş, boş; aksesuarlar kalan 468'de. Kapılar arkada. Paletler iç yüksekliğe kadar istiflenir.

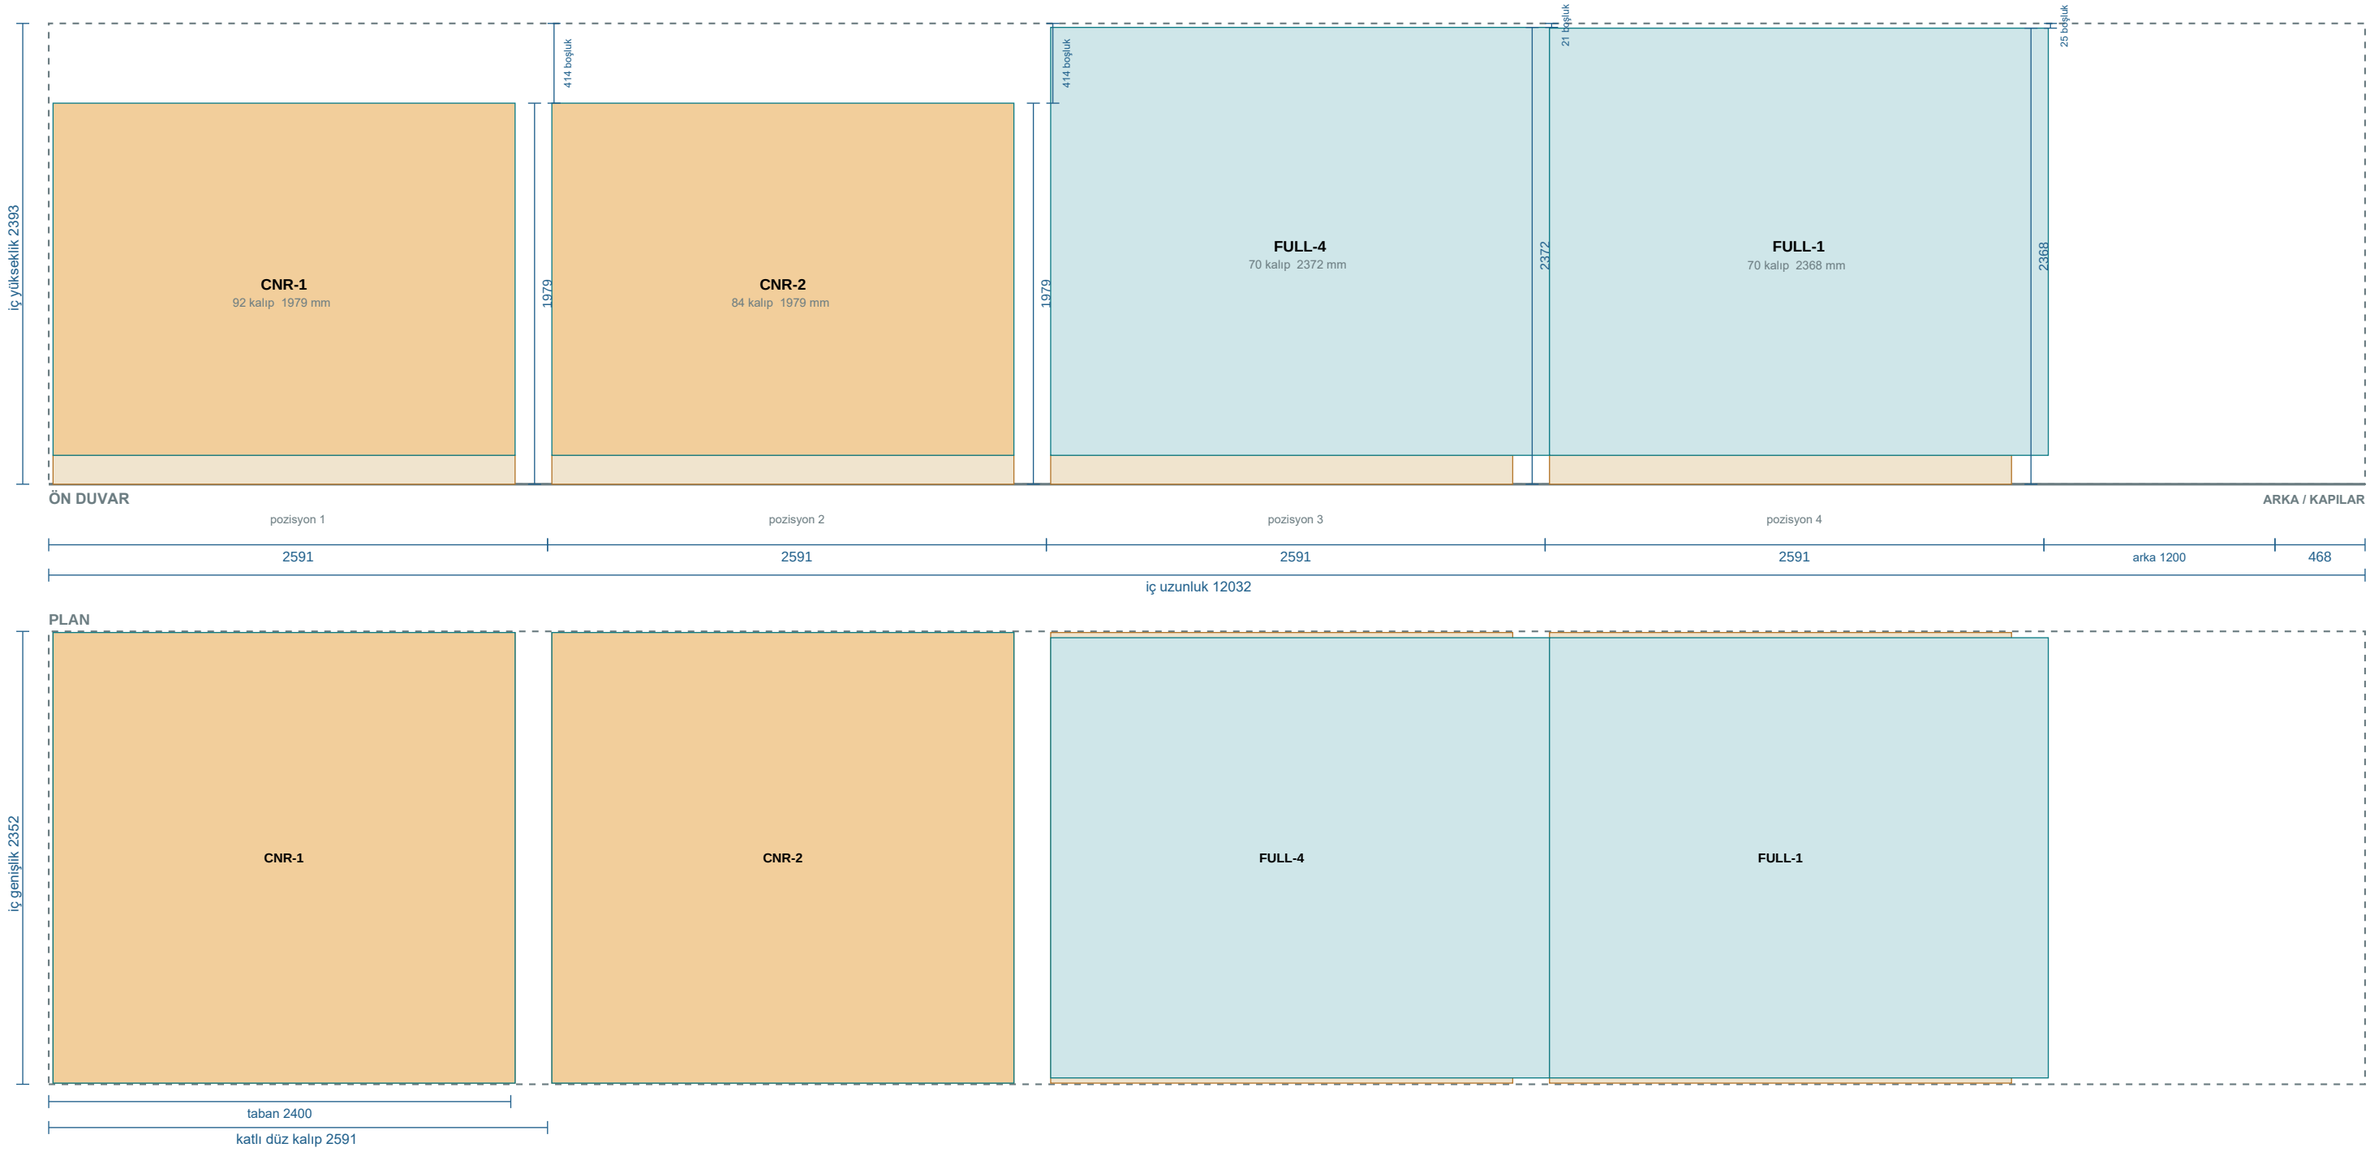

Boşaltma sırası (ilk gereken önce)

1. FULL-1 6in Std düz kalıp 70 kalıp L1 sıra 1-2 istif 2368 mm
2. FULL-4 8in Std düz kalıp 70 kalıp L1 sıra 1-2 istif 2372 mm
3. CNR-2 8in Std köşe kalıbı 84 kalıp L1 sıra 1-4 istif 1979 mm
4. CNR-1 6in Std köşe kalıbı 92 kalıp L1 sıra 1-5 istif 1979 mm

Nudura™

40 FT KONTEYNER YÜKLEME PLANI — **D1 YÜK 1**


İç 12032 x 2352 x 2393 mm; ölçekli çizilmiştir

PROJE	ES26-085 Blok A1 (1 blok, +%3 yedek)	KALIPLAR	316
ARAÇ	40 ft konteyner 12.03 m	POZİSYONLAR	4 / 4
PALETLER	4	EN YÜKSEK	2372 mm

Teslimat 1 - Yük 2 / 6 - 40 ft konteyner 12.03 m

4 palet: 4 / 4 ana pozisyon | 220 kalıp | en yüksek kolon 2372 mm / 2393 mm iç yükseklik | iç 12032 U x 2352 G x 2393 Y mm

Palet tabanı 2400 x 2340 (2.400 taban kasaya göre kesilir; katlı düz kalıplar boyuna 2591, enine 2286'ya taşar). Arka bölme: köşe kalıbı paleti 1200 derinlik enine döndürülmüş, boş; aksesuarlar kalan 468'de. Kapılar arkada. Paletler iç yüksekliğe kadar istiflenir.

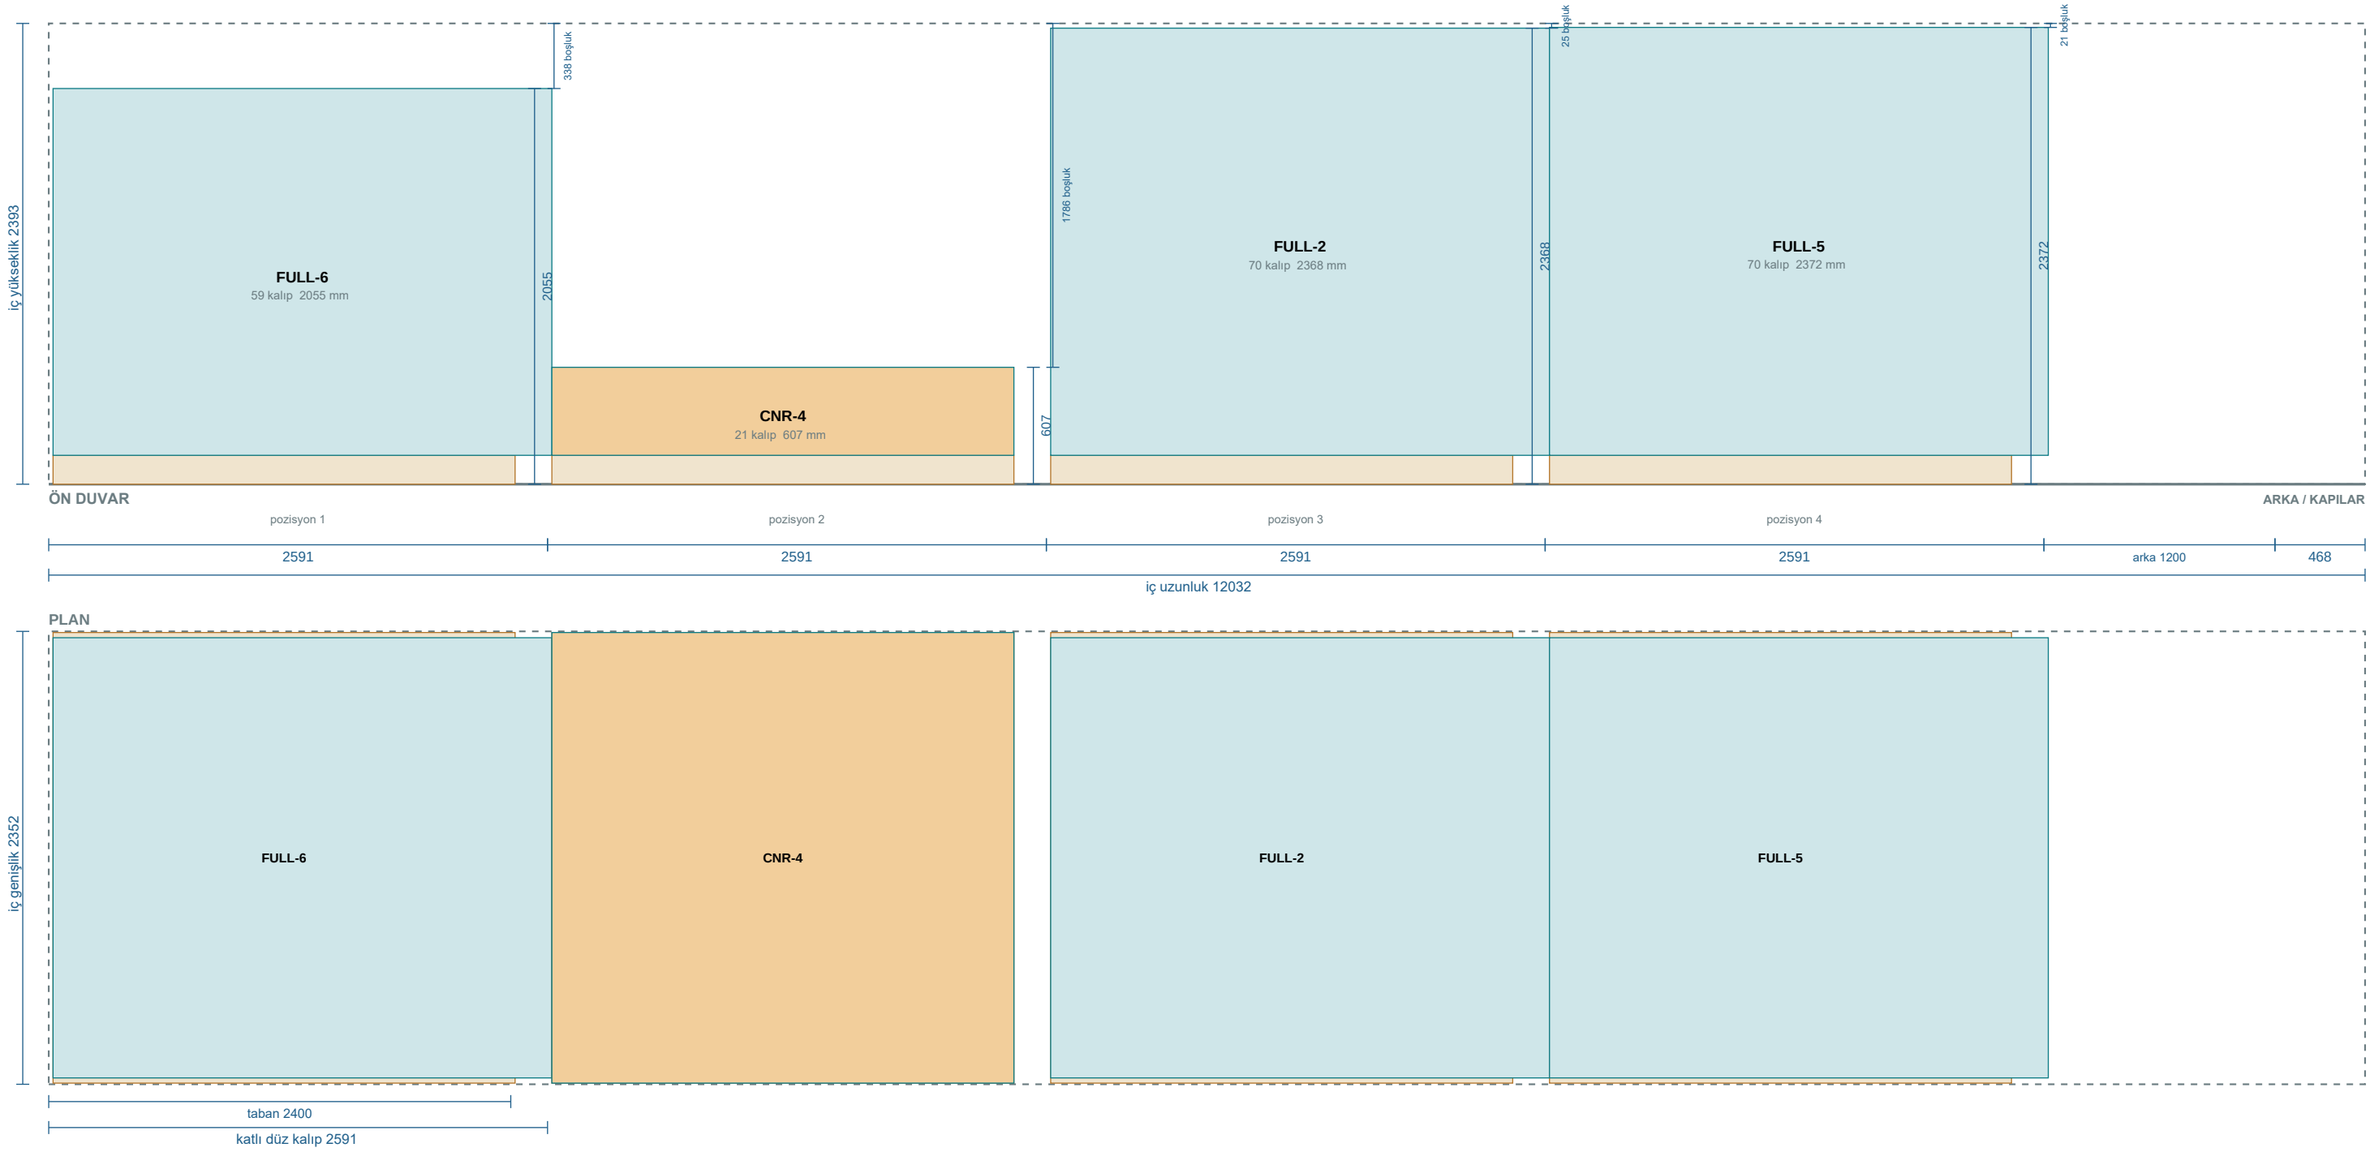

Boşaltma sırası (ilk gereken önce)

1. FULL-5 8in Std düz kalıp 70 kalıp L1 sıra 2-4 istif 2372 mm
2. FULL-2 6in Std düz kalıp 70 kalıp L1 sıra 2-5 istif 2368 mm
3. CNR-4 8in Std köşe kalıbı 21 kalıp L1 sıra 4-5 istif 607 mm
4. FULL-6 8in Std düz kalıp 59 kalıp L1 sıra 4-6 istif 2055 mm

Nudura™ **40 FT KONTEYNER YÜKLEME PLANI** **D1 YÜK 2**


İç 12032 x 2352 x 2393 mm; ölçekli çizilmiştir

PROJE	ES26-085 Blok A1 (1 blok, +%3 yedek)	KALIPLAR	220
ARAÇ	40 ft konteyner 12.03 m	POZİSYONLAR	4 / 4
PALETLER	4	EN YÜKSEK	2372 mm

Teslimat 1 - Yük 3 / 6 - 40 ft konteyner 12.03 m

4 palet: 4 / 4 ana pozisyon | 227 kalıp | en yüksek kolon 2368 mm / 2393 mm iç yükseklik | iç 12032 U x 2352 G x 2393 Y mm

Palet tabanı 2400 x 2340 (2.400 taban kasaya göre kesilir; katlı düz kalıplar boyuna 2591, enine 2286'ya taşar). Arka bölme: köşe kalıbı paleti 1200 derinlik enine döndürülmüş, boş; aksesuarlar kalan 468'de. Kapılar arkada. Paletler iç yüksekliğe kadar istiflenir.

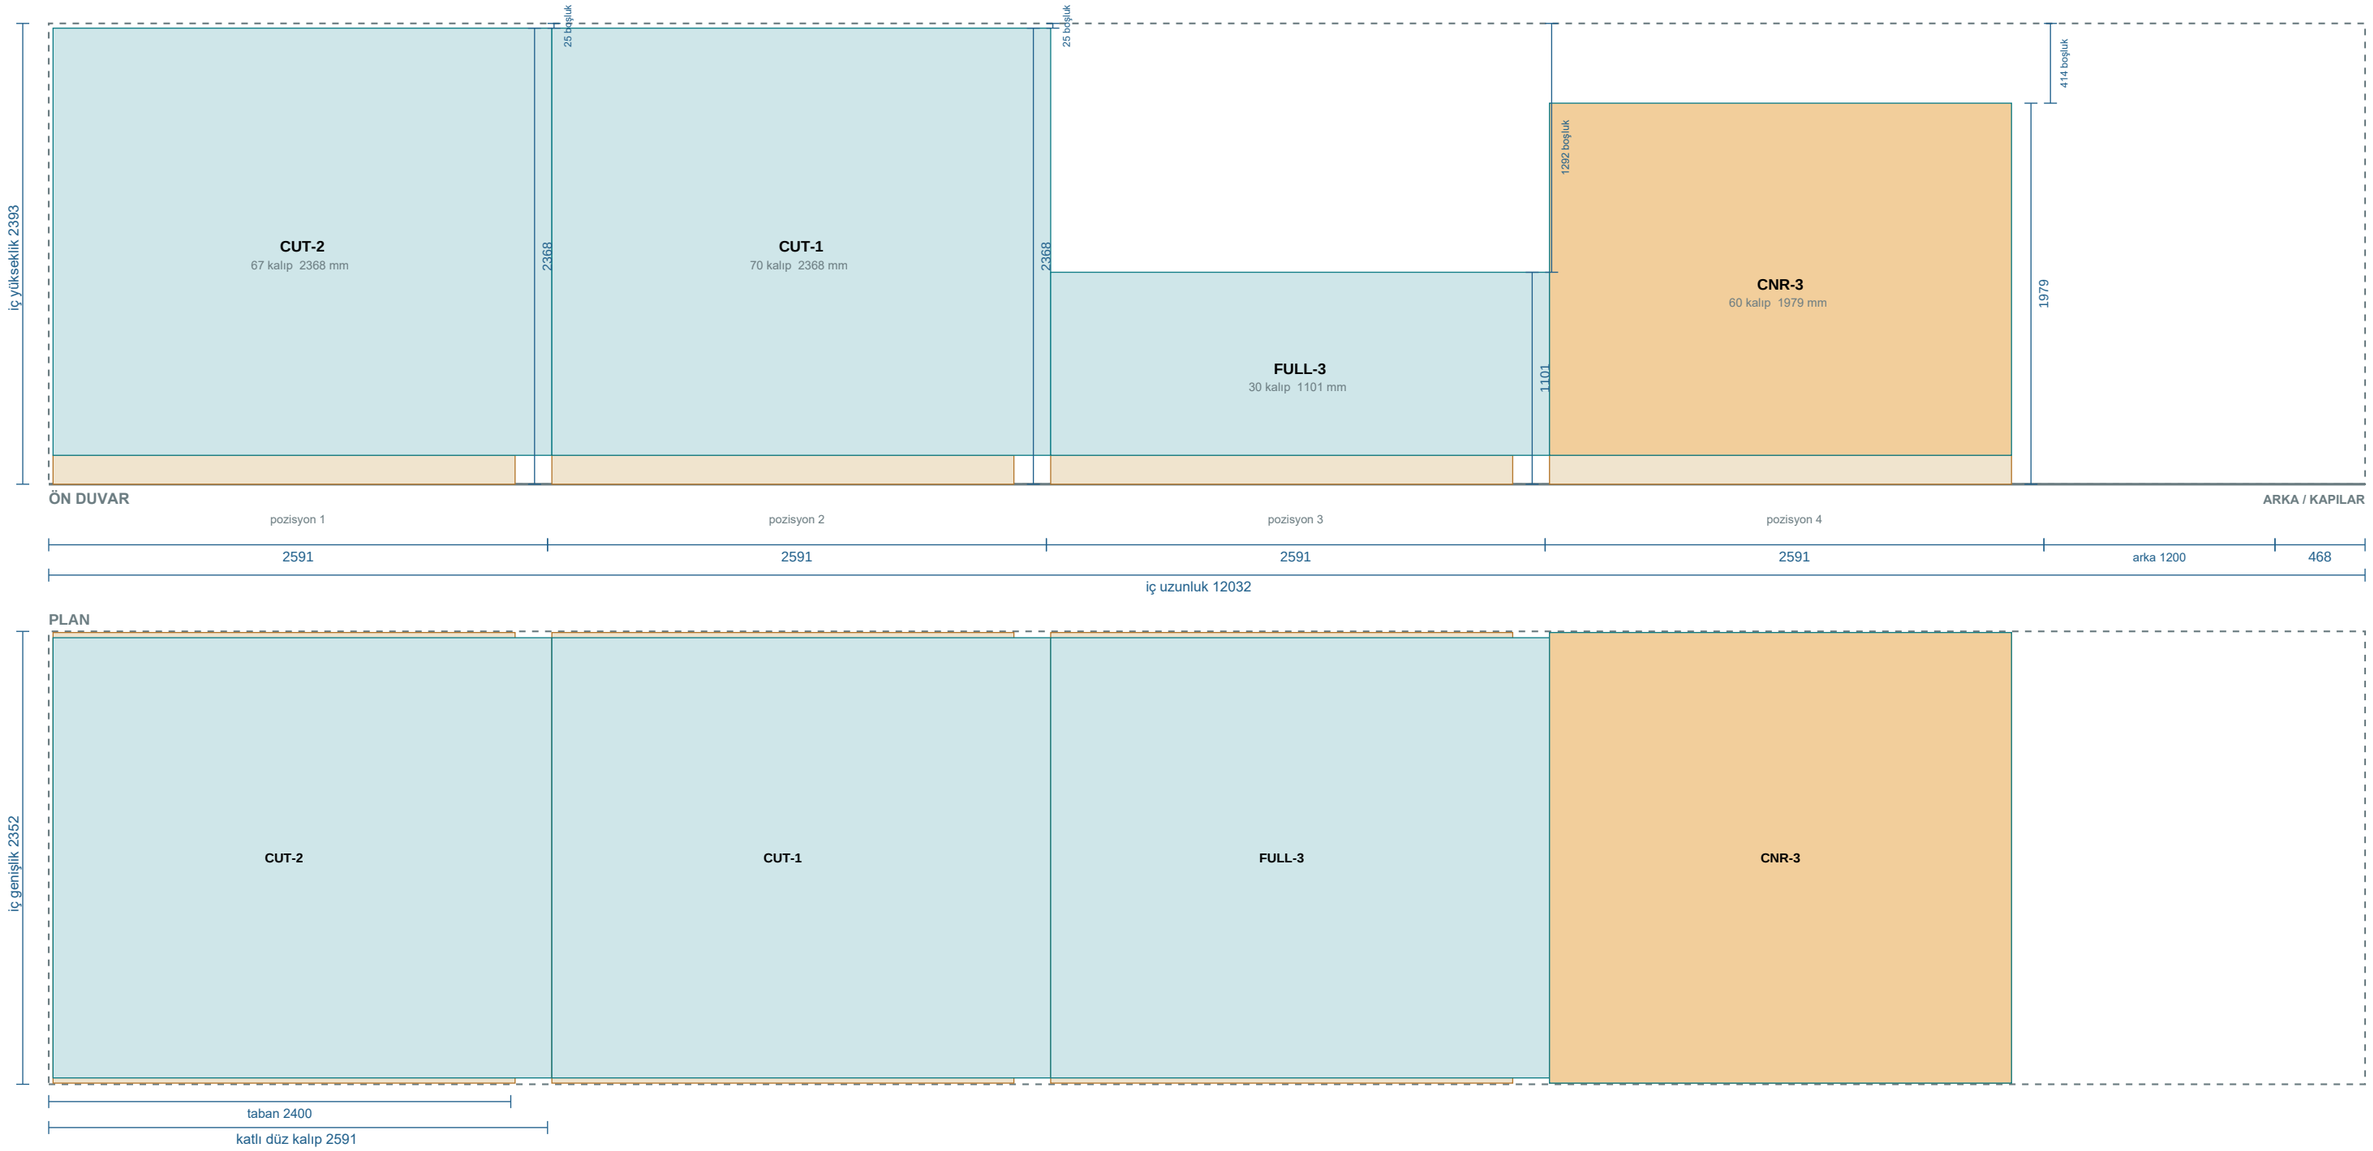

Boşaltma sırası (ilk gereken önce)

1. CNR-3 8in Std köşe kalıbı 60 kalıp L1 sıra 5-6 istif 1979 mm
2. FULL-3 6in Std düz kalıp 30 kalıp L1 sıra 5-6 istif 1101 mm
3. CUT-1 6in Std düz kalıp 70 kalıp sıra 1-6 istif 2368 mm
4. CUT-2 6in Std düz kalıp 67 kalıp sıra 1-6 istif 2368 mm

Nudura™

40 FT KONTEYNER YÜKLEME PLANI — **D1 YÜK 3**


İç 12032 x 2352 x 2393 mm; ölçekli çizilmiştir

PROJE	ES26-085 Blok A1 (1 blok, +%3 yedek)	KALIPLAR	227
ARAÇ	40 ft konteyner 12.03 m	POZİSYONLAR	4 / 4
PALETLER	4	EN YÜKSEK	2368 mm

Teslimat 1 - Yük 4 / 6 - 40 ft konteyner 12.03 m

4 palet: 4 / 4 ana pozisyon | 276 kalıp | en yüksek kolon 2372 mm / 2393 mm iç yükseklik | iç 12032 U x 2352 G x 2393 Y mm

Palet tabanı 2400 x 2340 (2.400 taban kasaya göre kesilir; katlı düz kalıplar boyuna 2591, enine 2286'ya taşar). Arka bölme: köşe kalıbı paleti 1200 derinlik enine döndürülmüş, boş; aksesuarlar kalan 468'de. Kapılar arkada. Paletler iç yüksekliğe kadar istiflenir.

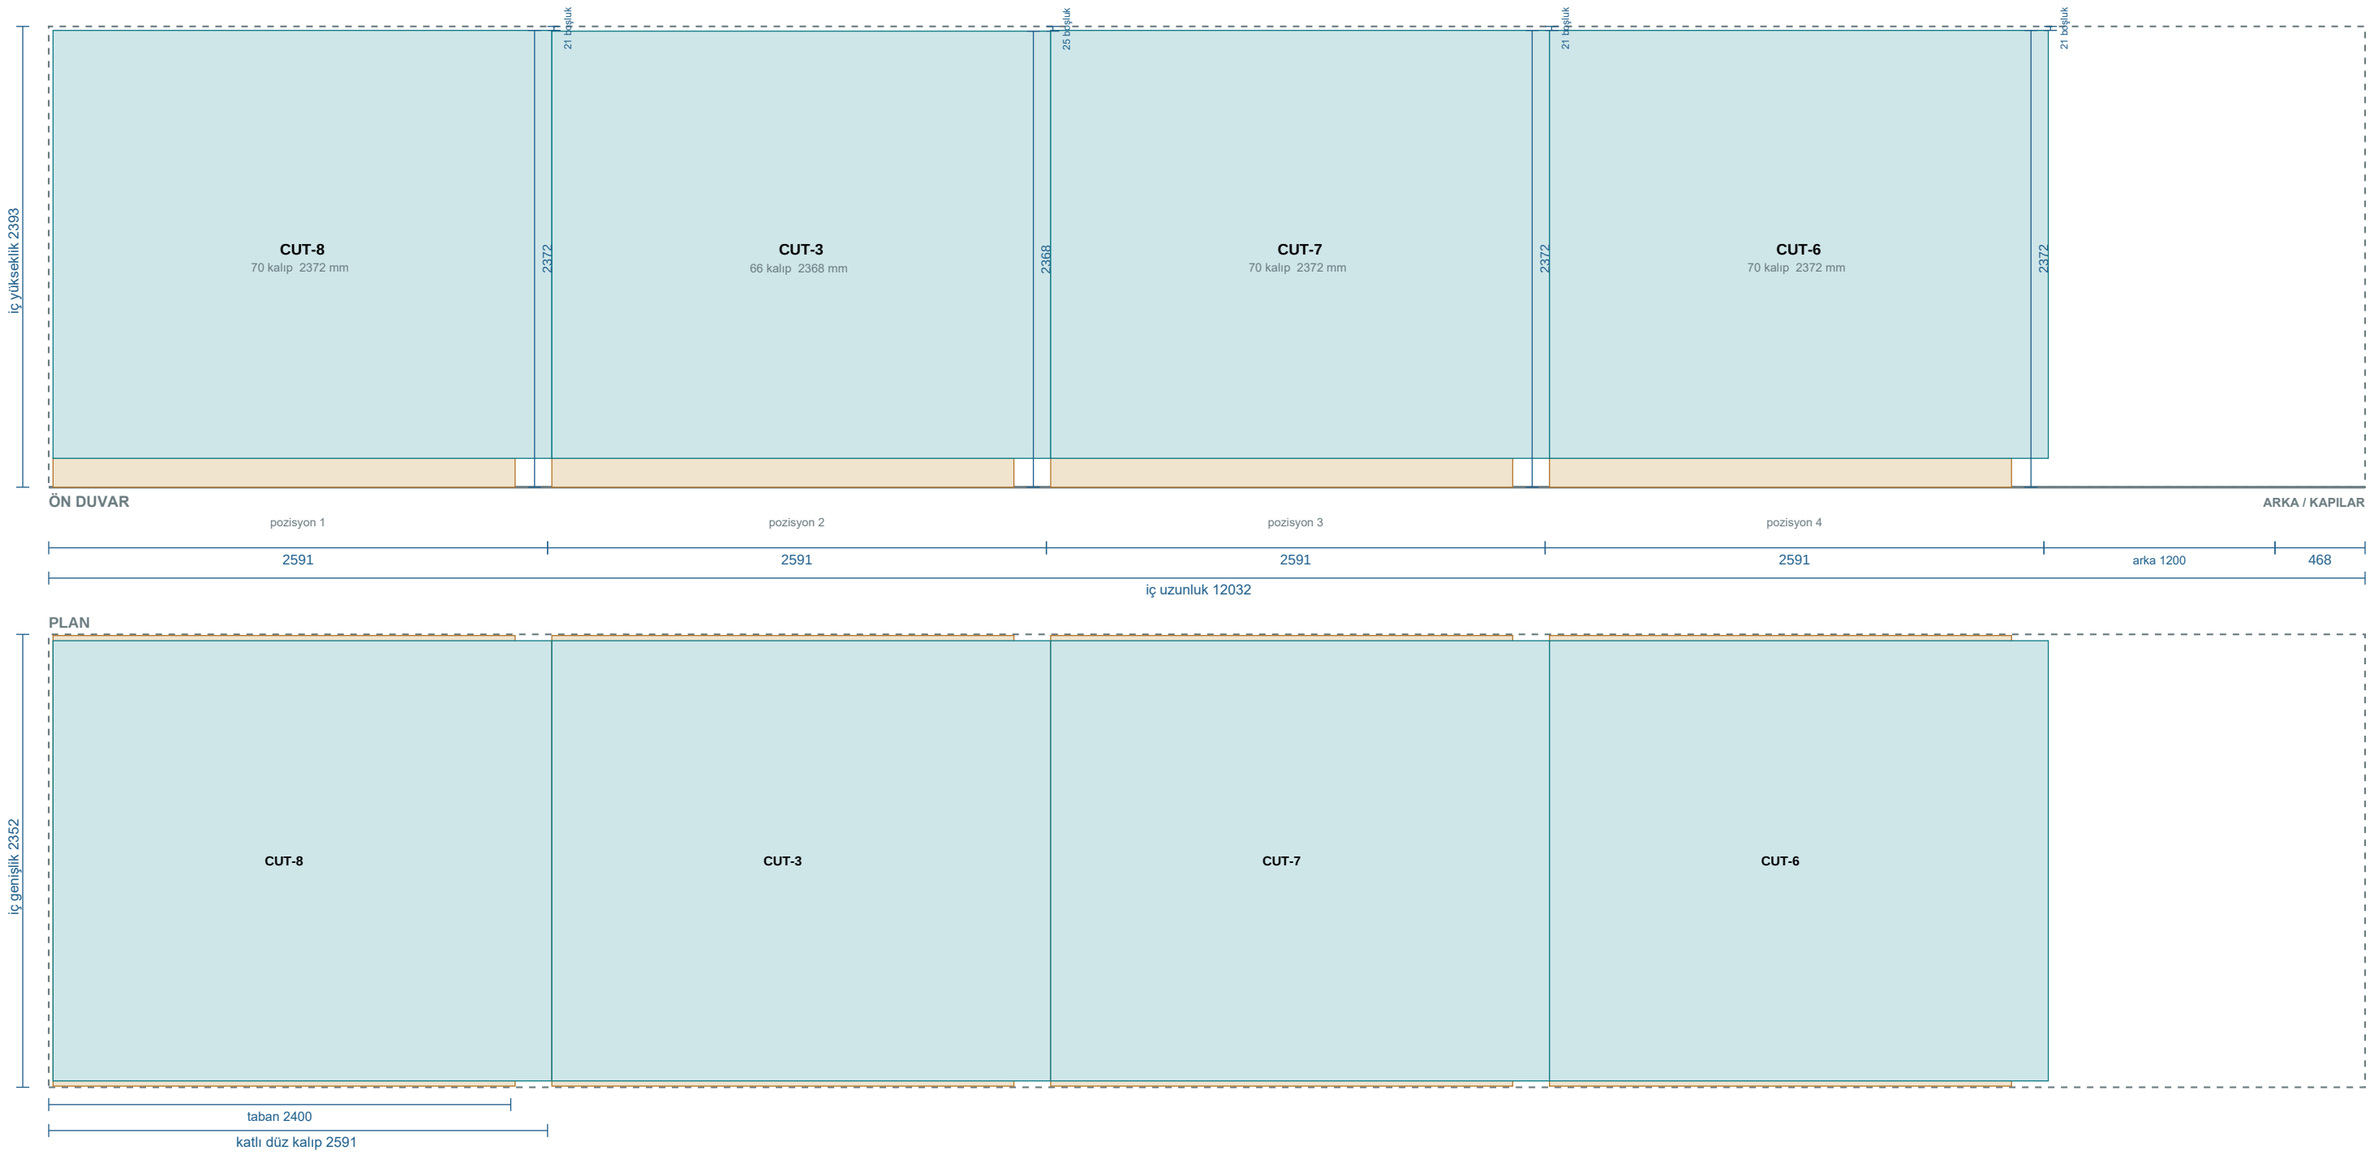

Boşaltma sırası (ilk gereken önce)

1. CUT-6 8in Std düz kalıp 70 kalıp sıra 1-6 istif 2372 mm
2. CUT-7 8in Std düz kalıp 70 kalıp sıra 1-6 istif 2372 mm
3. CUT-3 6in Std düz kalıp 66 kalıp sıra 2-6 istif 2368 mm
4. CUT-8 8in Std düz kalıp 70 kalıp sıra 2-6 istif 2372 mm

Nudura™

40 FT KONTEYNER YÜKLEME PLANI **D1 YÜK 4**


İç 12032 x 2352 x 2393 mm; ölçekli çizilmiştir

PROJE	ES26-085 Blok A1 (1 blok, +%3 yedek)	KALIPLAR	276
ARAÇ	40 ft konteyner 12.03 m	POZİSYONLAR	4 / 4
PALETLER	4	EN YÜKSEK	2372 mm

Teslimat 1 - Yük 5 / 6 - 40 ft konteyner 12.03 m

4 palet: 4 / 4 ana pozisyon | 262 kalıp | en yüksek kolon 2372 mm / 2393 mm iç yükseklik | iç 12032 U x 2352 G x 2393 Y mm

Palet tabanı 2400 x 2340 (2.400 taban kasaya göre kesilir; katlı düz kalıplar boyuna 2591, enine 2286'ya taşar). Arka bölme: köşe kalıbı paleti 1200 derinlik enine döndürülmüş, boş; aksesuarlar kalan 468'de. Kapılar arkada. Paletler iç yüksekliğe kadar istiflenir.

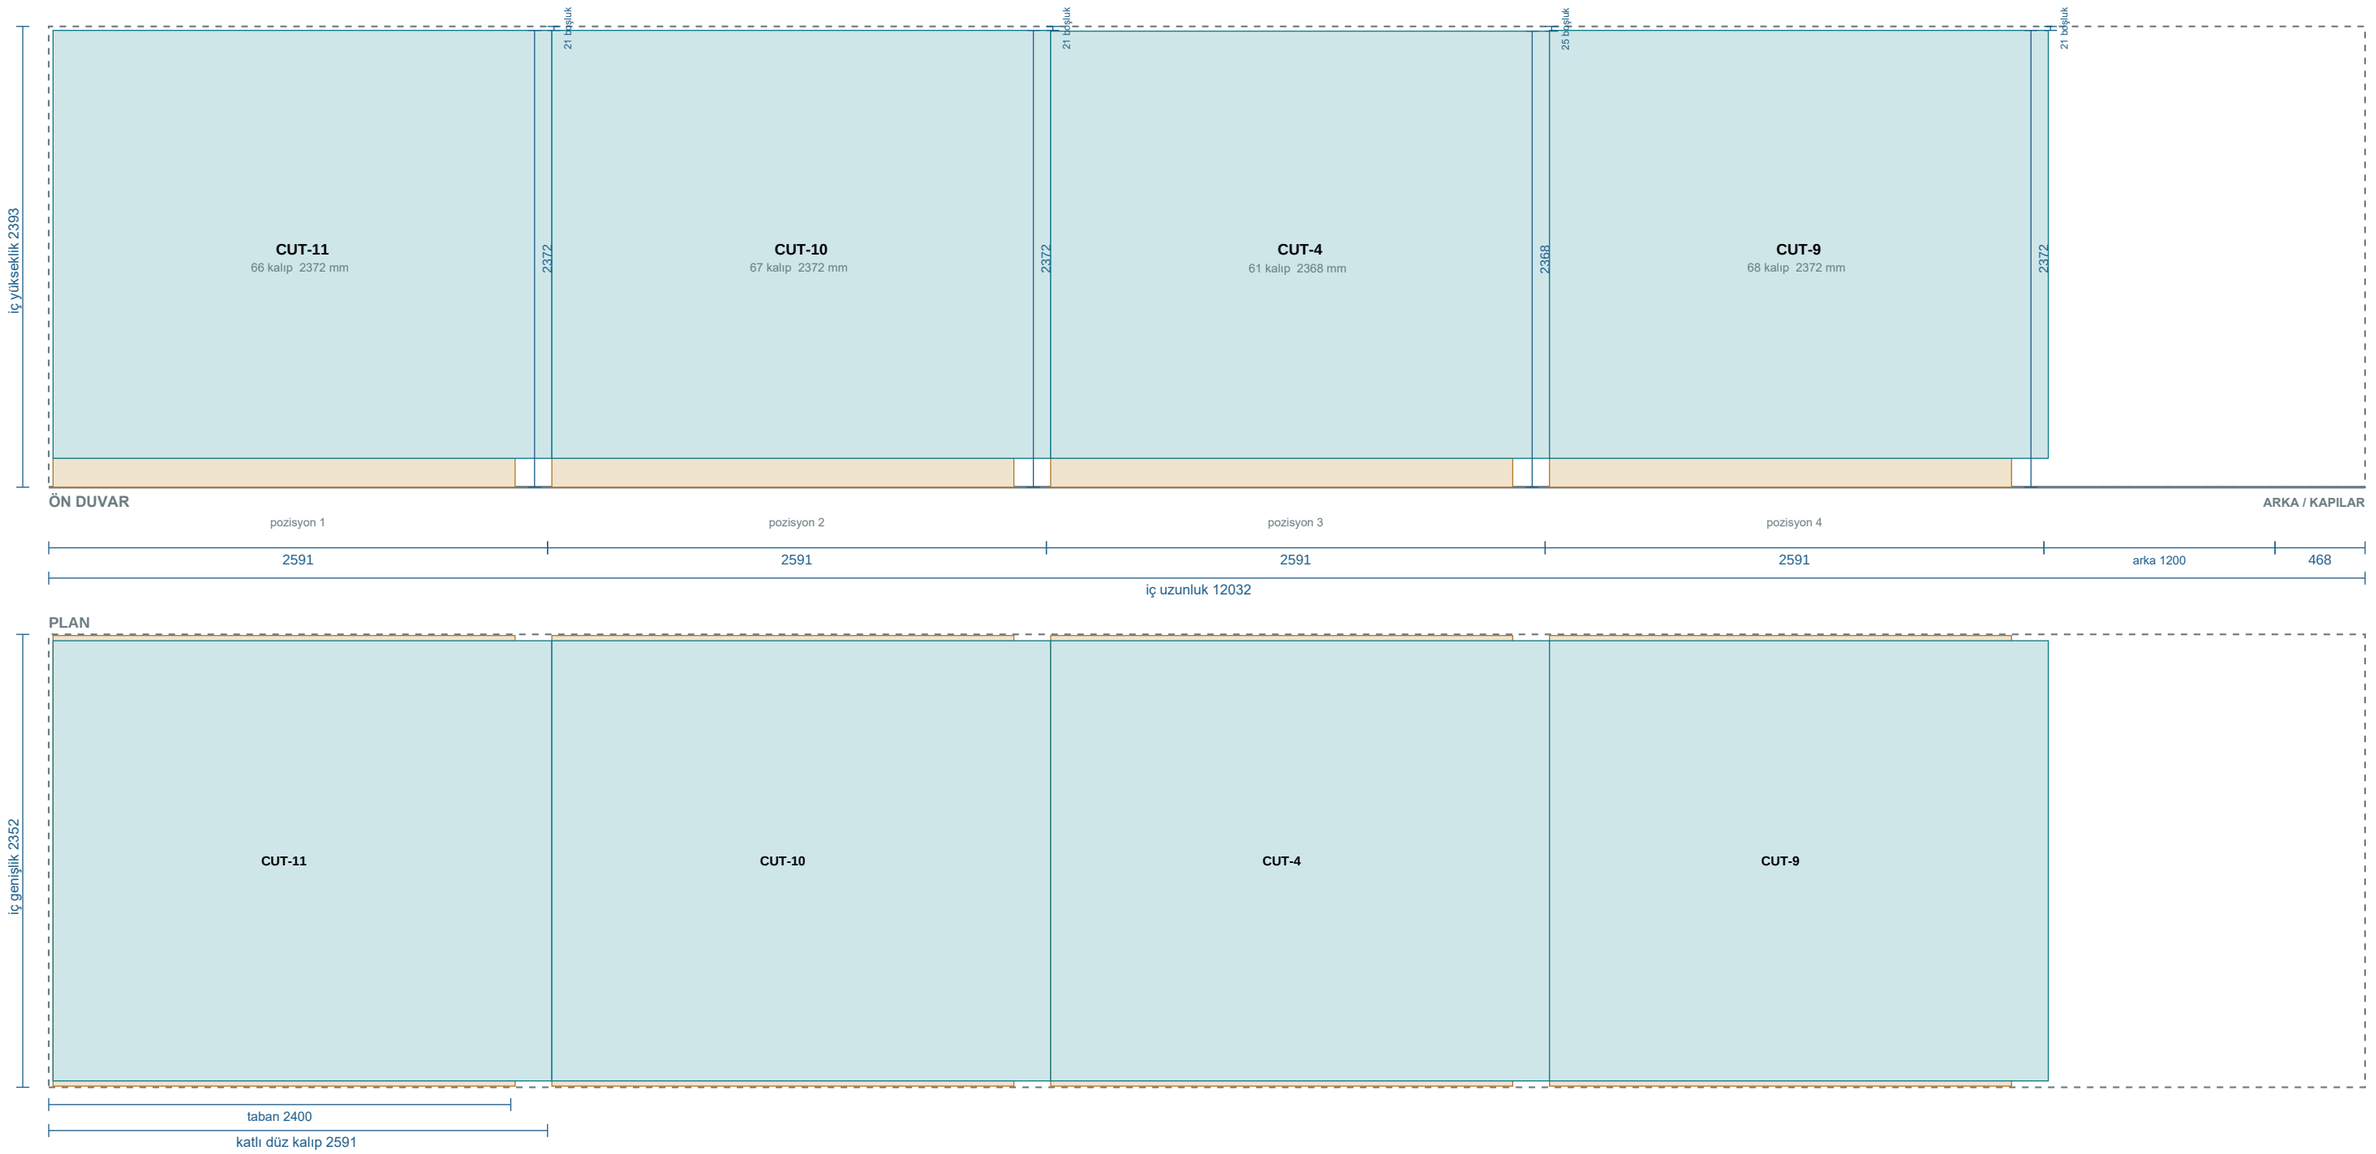

Boşaltma sırası (ilk gereken önce)

1. CUT-9 8in Std düz kalıp 68 kalıp sıra 2-6 istif 2372 mm
2. CUT-4 6in Std düz kalıp 61 kalıp sıra 3-6 istif 2368 mm
3. CUT-10 8in Std düz kalıp 67 kalıp sıra 4-6 istif 2372 mm
4. CUT-11 8in Std düz kalıp 66 kalıp sıra 5-6 istif 2372 mm

Nudura™ **40 FT KONTEYNER YÜKLEME PLANI** **D1 YÜK 5**

İç 12032 x 2352 x 2393 mm; ölçekli çizilmiştir

PROJE	ES26-085 Blok A1 (1 blok, +%3 yedek)	KALIPLAR	262
ARAÇ	40 ft konteyner 12.03 m	POZİSYONLAR	4 / 4
PALETLER	4	EN YÜKSEK	2372 mm


Teslimat 1 - Yük 6 / 6 - 40 ft konteyner 12.03 m

2 palet: 1 / 4 ana pozisyon | 48 kalıp | en yüksek kolon 1886 mm / 2393 mm iç yükseklik | iç 12032 U x 2352 G x 2393 Y mm

Palet tabanı 2400 x 2340 (2.400 taban kasaya göre kesilir; katlı düz kalıplar boyuna 2591, enine 2286'ya taşar). Arka bölme: köşe kalıbı paleti 1200 derinlik enine döndürülmüş, boş; aksesuarlar kalan 468'de. Kapılar arkada. Paletler iç yüksekliğe kadar istiflenir.



PLAN

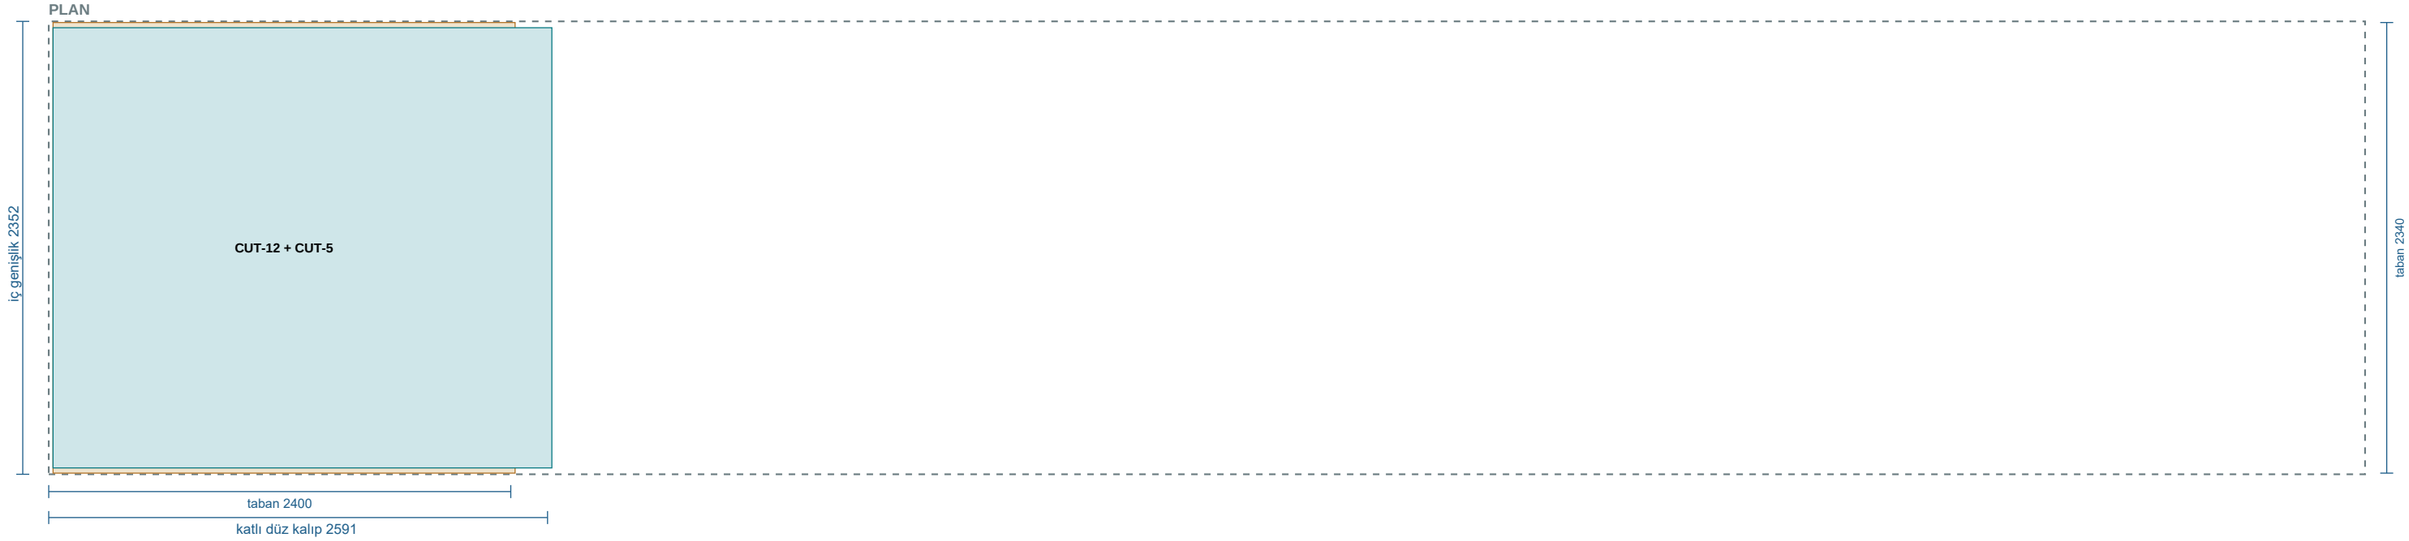

Boşaltma sırası (ilk gereken önce)

1. CUT-5 6in Std düz kalıp 30 kalıp sıra 6 istif 1101 mm
2. CUT-12 8in Std düz kalıp 18 kalıp sıra 6 istif 785 mm

Nudura™

40 FT KONTEYNER YÜKLEME PLANI

D1 YÜK 6

İç 12032 x 2352 x 2393 mm; ölçekli çizilmiştir

PROJE	ES26-085 Blok A1 (1 blok, +%3 yedek)	KALIPLAR	48
ARAÇ	40 ft konteyner 12.03 m	POZİSYONLAR	1 / 4
PALETLER	2	EN YÜKSEK	1886 mm
